从项目管理过程考虑	1.项目整合管理：制定项目章程；制定项目管理计划；指导与管理项目工作；管理项目知识；监控项目工作；实施整体变更控制，结束项目。 2.范围管理：规划范围管理；收集需求；定义范围；创建WBS；确认范围；控制范围 3.进度管理：规划进度管理；定义活动；排列活动顺序；估算活动持续时间；制定进度计划；控制进度 4.成本管理：规划成本管理；估算成本；制定预算；控制成本 5.质量管理：规划质量管理；管理质量；控制质量 6.资源管理：规划资源管理；估算活动资源；获取资源；建设团队；管理团队，控制资源 7.沟通管理：规划沟通管理；管理沟通；监督沟通 8.风险管理：规划风险管理；识别风险；实施定性风险分析；实施定量风脸分析；规划风险应对；实施风险应对；监督风险 9.采购管理：规划采购管理；实施采购；控制采购 10.干系人管理：识别干系人；规划干系人管理；管理干系人参与；监督干系人参与 11.配置管理：编制配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、配置管理回顾与改进 12.变更管理：提出申请、影响分析、CCB审批、通知变更、监控记录、更新
从关键词眼反映问题	1.客户验收不通过、争执不满意、多头汇报（沟通不到位） 2.新项目、新技术、新员工、第一次（有风险，无经验，缺培训） 3.修改、变更（没有走变更控制流程） 4.之后才发现了问题、延期（监控不到位，没有做好控制） 5.认为、觉得、初步、匆忙、简单、大致（缺乏分析，没有具体详细的内容）
从人员方面考虑	1.人员经验（缺乏经验和技能，培训不到位） 2.人员态度（相关方面意识淡薄，考虑不周，不愿意合作） 3.人员安排(身兼数职，没有安排专职人员) 4.一人包办(一个人做规划，一个人审批或没审批，没有集体开会讨论确认） 5.人员沟通(没做好沟通，工作混乱，信息发布有问题）
从制度规范考虑	1.评审、确认、验收，阶段管理(没有做，没有做到位，阶段没确认没评审，没有找干系人确认、获得一致同意) 2.制度不健全或没建立(如成本管理制度、质量体系、沟通管理机制等） 3.没有按照需求使用对应的工具 4.规则及绩效(没有共同的规则、不公平，没有绩效和考核机制)

1、整合管理常见问题归纳



关键记忆点：

1、过程:章程、计划(全体/评审)、指导与管理、管理知识、没有走变更控制流程、监控

2、子管理的角度入手:进度、成本、沟通、风险、合同、配置等

软考羽仪老师

2、范围管理常见问题归纳



关键记忆点：

1、过程:计划(全体/评审)、需求(全体/确认)、范围说明书(全体/评审)创建WBS(100%，基准-评审)、确认、控制

3、质量管理常见问题归纳



关键记忆点：
1、过程:计划(全体/评审)、管理质量、控制
2、专职、意识、体系、标准、规范、经验

软考羽仪老师

4、资源管理常见问题归纳




关键记忆点：


1、计划(全体/评审)、获取(储备)、估算、建设、管理(冲突)、控制

2、岗位、目标、职责、流程、考核、纪律

软考羽仪老师

5、沟通、干系人管理常见问题归纳

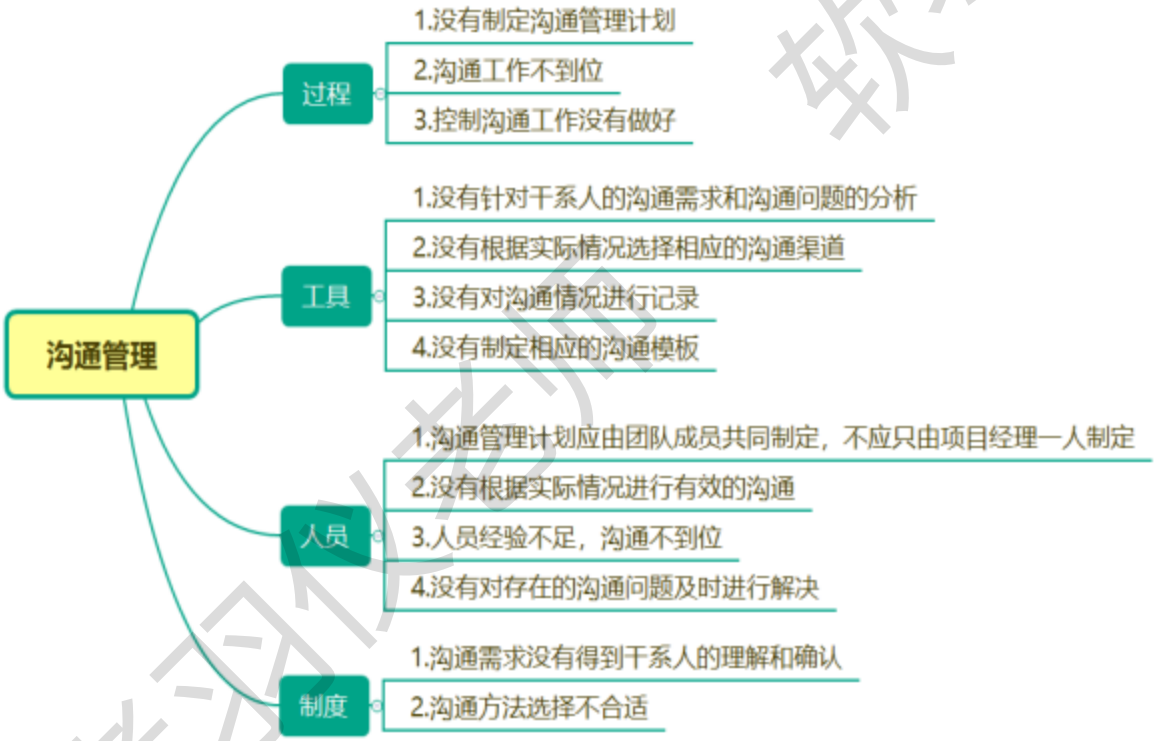

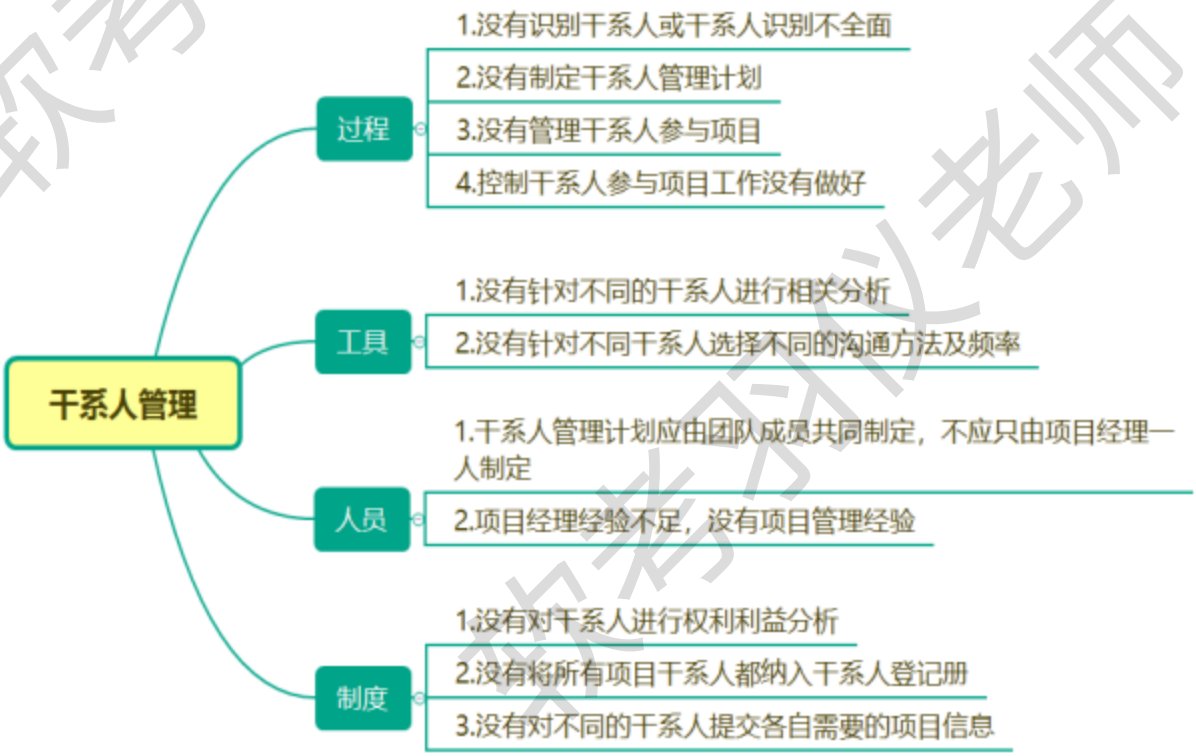

关键记忆点：

1、沟通管理过程：计划、管理、监督；
**　干系人管理过程：识人、计划、管理、监督**
2、需求、模板、技巧方法、频率、渠道

6、采购管理常见问题归纳




关键记忆点：

1、规划、实施、控制

2、招投标、调查、合同(签订、付款方式、违约责任、验收标准)、记录


7、配置管理常见问题归纳

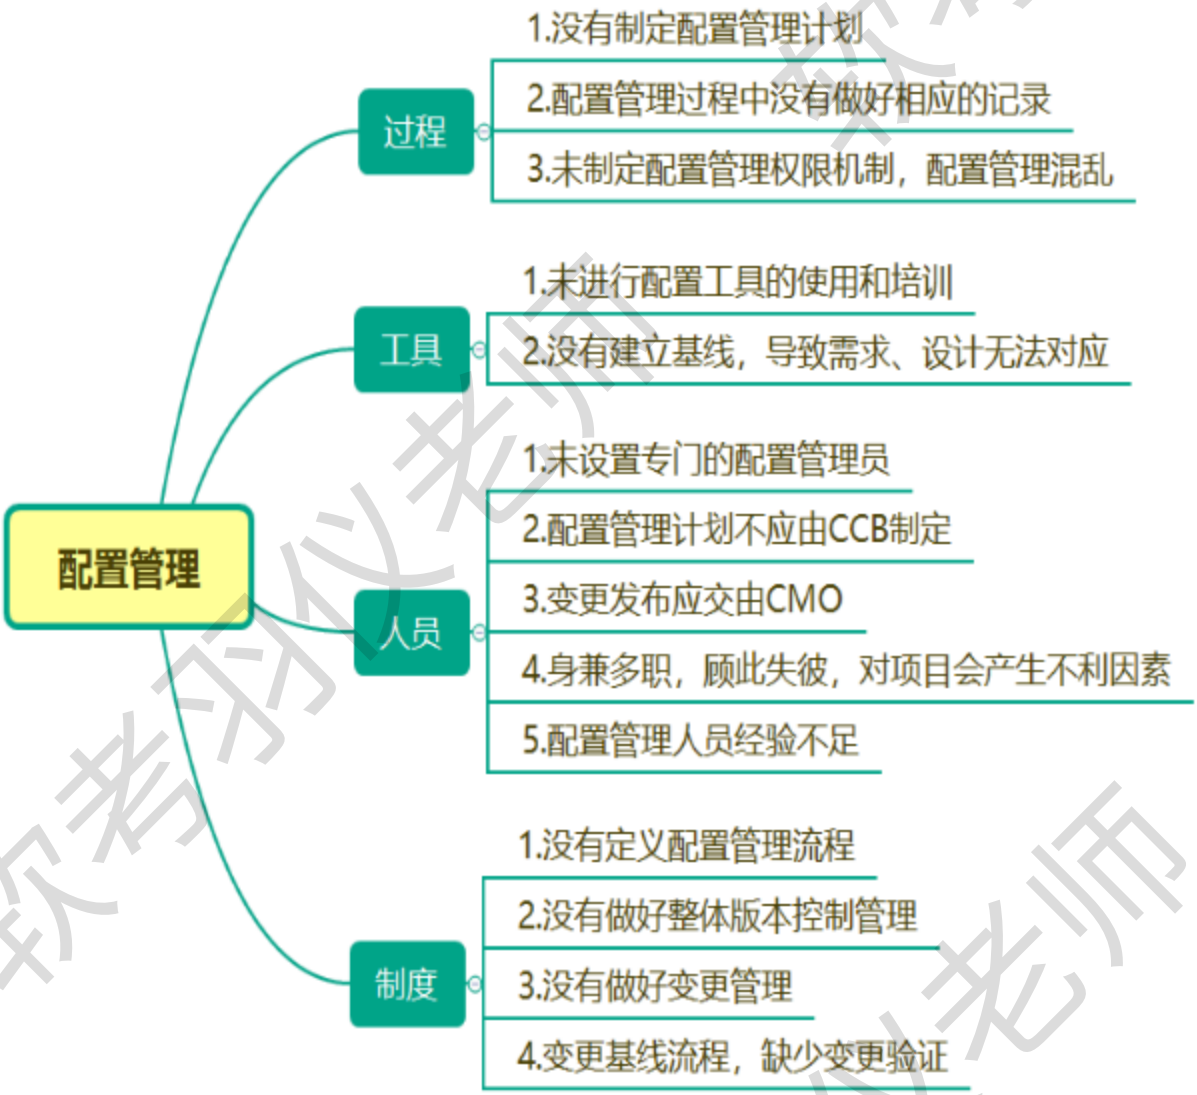

关键记忆点：
1、过程：计划、识别、控制、状态、审计
2、专职、版本管理、基线、配置库、权限

软考羽仪老师

8、变更管理常见问题归纳

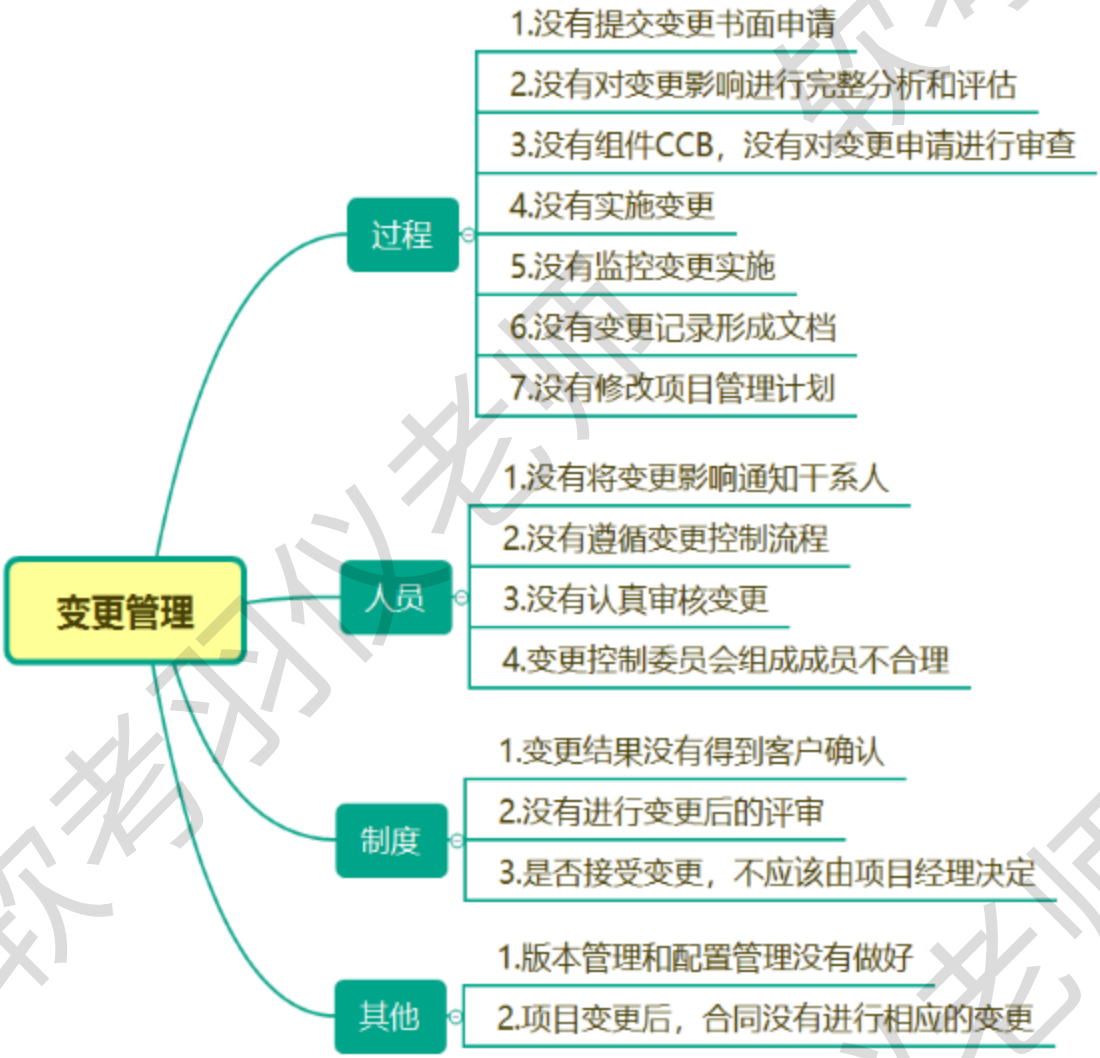

软考羽仪老师

9、风险管理常见问题归纳



关键记忆点：

1.过程：计划（全体/评审）、识别（全体/反复）、定性、定量、规划、实施、监督

2、专职、意识、工具
